

29.370.038/0001-82
 TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA S/A
 Praça Luz, 1678 - 1º Andar
 Centro / CEP: 55.540-000 / Palmareis - PE

João Alexandre D. G. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 201116-D/PE

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MDS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE		Planilha de Preços		SIACO		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº.001	
PROCESSO Nº 06/2019 TP Nº 001/2019		BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS		Sistema de Acompanhamento de Obras		1.0		PERÍODO: 30/05/2019 a 10/06/2019	
N.º DO CONTRATO : 0364/2016		TOTAL ADITIVOS:		INÍCIO: 30/05/2019		PERÍODO MEDIDO		VALOR TOTAL R\$ 2.441,10	
MDS 0364/2016		TOTAL MEDIDO 8º ADITIVO:		ATUAL: 14/06/2019		%		VALOR TOTAL R\$ 2.441,10	
VALOR DOS CONTRATOS (REAJUSTADOS):		MEDIDO EM BMs e ADITIVOS		QUANT. TOTAL R\$		EXEC.		QUANT. TOTAL R\$	
ACOMPANHAMENTO DE OBRA - EXECUTADO EM TEMPO REAL		PROXIMO BM (Aumentado Diferencial)		QUANT. TOTAL R\$		%		QUANT. TOTAL R\$	
SALDO DO CONTRATO - A SER REALIZADO		CONTRATO AJUSTADO		QUANT. TOTAL R\$		%		QUANT. TOTAL R\$	
DISCRIMINAÇÃO		R\$/UNIT.		TOTAL R\$		%		TOTAL R\$	
ITEM	COD.	UNID.	QUANT.	R\$/UNIT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL R\$
1.0					4.615,80				
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74269/001 SINAPI/MUNICIPAL	M²	6,00	406,85	2.441,10	6,00	2.441,10	100,00%	406,85
	08415/008E	UND	3,00	724,90	2.174,70	0,00	2.174,70	0,00%	724,90
Ensaio - taxa de percolação do solo (para cada determinação ou furo)									
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES -									
2.0					226.255,50				
TIPO 01 - A									
2.1	planilha anexa	UND	25,00	5.829,32	145.793,00	0,00	145.793,00	0,00%	5.829,32
	planilha anexa	UND	25,00	2.023,44	50.586,00	0,00	50.586,00	0,00%	2.023,44
	planilha anexa	UND	25,00	1.197,46	29.936,50	0,00	29.936,50	0,00%	1.197,46
SUMIDOURO									
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES -									
3.0					28.764,04				
TIPO 01 - B									
2.2	planilha anexa	UND	3,00	5.829,32	17.487,96	0,00	17.487,96	0,00%	5.829,32
2.3	planilha anexa	UND	3,00	2.023,44	6.070,32	0,00	6.070,32	0,00%	2.023,44
2.4	planilha anexa	UND	3,00	1.741,92	5.225,76	0,00	5.225,76	0,00%	1.741,92
SUMIDOURO									
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES -									
4.0					165.680,95				
TIPO 04 - A									
4.1	planilha anexa	UND	19,00	5.499,15	104.483,85	0,00	104.483,85	0,00%	5.499,15
4.2	planilha anexa	UND	19,00	2.023,44	38.445,36	0,00	38.445,36	0,00%	2.023,44
4.3	planilha anexa	UND	19,00	1.197,46	22.751,74	0,00	22.751,74	0,00%	1.197,46
SUMIDOURO									
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES -									
4.4					27.793,53				
TIPO 04 - B									
4.5	planilha anexa	UND	3,00	5.499,15	16.497,45	0,00	16.497,45	0,00%	5.499,15
4.6	planilha anexa	UND	3,00	2.023,44	6.070,32	0,00	6.070,32	0,00%	2.023,44
4.7	planilha anexa	UND	3,00	1.741,92	5.225,76	0,00	5.225,76	0,00%	1.741,92
SUMIDOURO									
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES -									
4.8					20.864,24				
TIPO 04 - A									
4.9	planilha anexa	UND	2,00	5.499,15	10.998,30	0,00	10.998,30	0,00%	5.499,15
4.10	planilha anexa	UND	2,00	2.318,64	4.637,28	0,00	4.637,28	0,00%	2.318,64
4.11	planilha anexa	UND	2,00	2.614,33	5.228,66	0,00	5.228,66	0,00%	2.614,33
4.12									
TOTAL GERAL					473.994,06		2.441,10	0,52%	2.441,10
GERENCIAMENTO DE OBRA - ESPECIFICAÇÕES									
INFORMAÇÕES									
GLOBAL									
REALIZADO									
SALDO DA OBRA					0,00				
EXECUTADO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001									



FRIDAY LOCAL TIME
" 5




FRIDAY LOCAL TIME
" 5



TUESDAY LOCAL TIME
" 5



TUESDAY LOCAL TIME
" 5

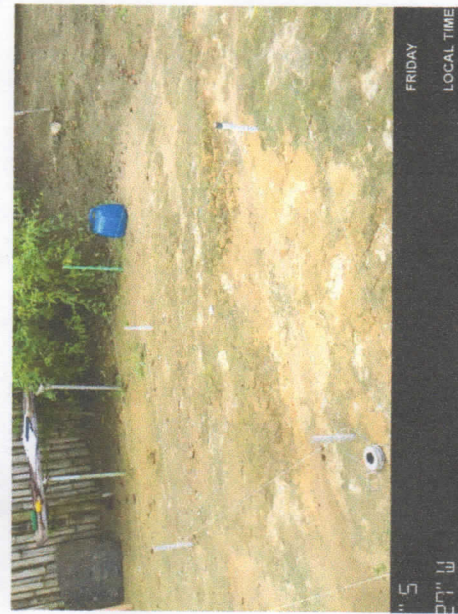

FRIDAY LOCAL TIME
" 5




FRIDAY LOCAL TIME
" 5



TUESDAY LOCAL TIME
" 5






FRIDAY LOCAL TIME
" 5

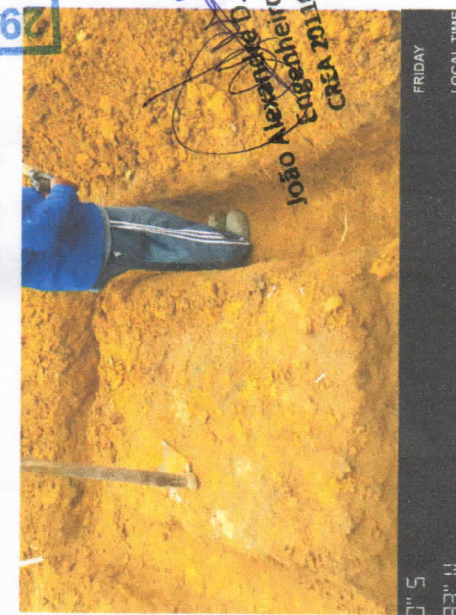

FRIDAY LOCAL TIME
" 5

TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA SIRELLI
Praga da 1013 - 1º Andar
Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE
039/0901-82

Engenheiro Civil
João Alexandre G. S. de S. Silva
CREA 20116-5/01/PE

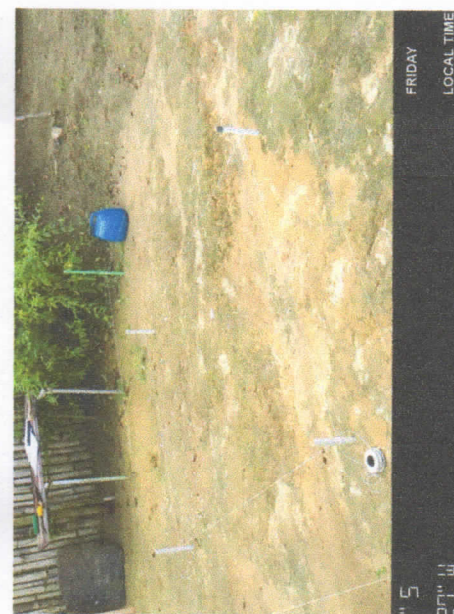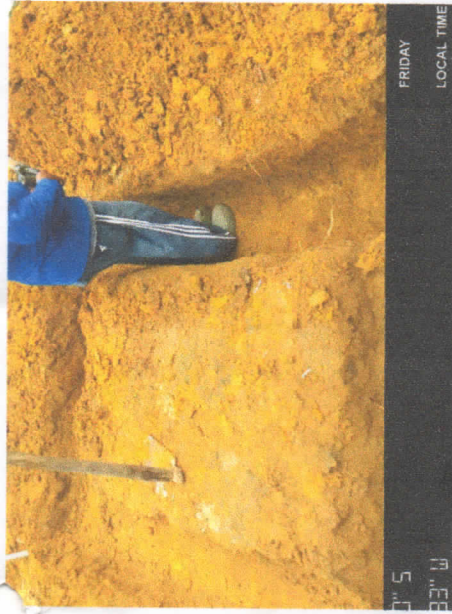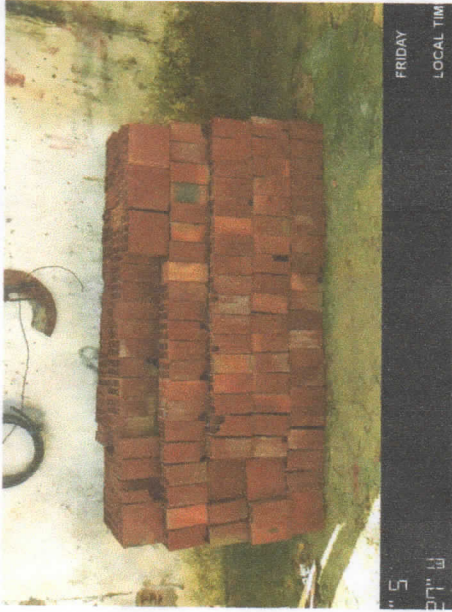

TECH SERVIÇOS EIRELI
Praça ... 1º Andar
Centro / CEP: 55.040-000 / Palmares-PE

[Handwritten Signature]

João Alexandre D. G. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 20116-D/PE
