

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	SIN	VALOR LICITADO	R\$	1.008.274,68	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	889.764,78		
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	889.764,78	0,00%	
BM - PERÍODO	06/01/22	03/02/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	788.042,03	84,25%
			BM - R\$ MENSAL	R\$	28.560,67	3,17%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	141.722,70	15,75%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE			
CONTRATADA	ZARA SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	CNPJ :	21.127.171/0001-56	
PROCESSO Nº	016/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"	
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021	BDI %	MAT = --	SER = 19,81%

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO										SUPRIMIR	TOTAL		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																								
1.0																								
1.1	S	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	6,00				6,00	320,23	1,0000	-	-	1.921,38	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	1.921,38	100,00%	
<b>DEMOLIÇÕES / RETIRADAS</b>																								
2.0																								
2.1	S	EMLURB	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M²	200,00				200,00	16,12	1,0000	-	-	3.224,00	-	0,00%	-	-	-	200,00	3.224,00	100,00%	
2.2	S	EMLURB	03.01.220	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	M²	150,00				150,00	19,60	1,0000	-	-	2.940,00	-	0,00%	-	-	-	150,00	2.940,00	100,00%	
2.3	S	EMLURB	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M²	800,00				800,00	13,11	1,0000	-	-	10.488,00	111,39	1.460,32	13,92%	800,00	10.488,00	100,00%	-	-	0,00%
<b>TERRAPLENAGEM / SUB BASE / BASE</b>																								
3.0																								
3.1	S	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	130,00				130,00	69,33	1,0000	-	-	9.012,90	-	0,00%	-	-	-	130,00	9.012,90	100,00%	
3.2	S	EMLURB	05.01.140	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO.	M³	50,00				50,00	4,50	1,0000	-	-	225,00	-	0,00%	-	-	-	50,00	225,00	100,00%	
3.3	S	EMLURB	20.02.030	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG. UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20,0 CM, TEOR DE COMPACTAÇÃO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-46-64), INCLUSIVE FORNECIDO MATERIAL PROV. DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO), D.M.T. 12KM.	M²	250,00				250,00	16,89	1,0000	-	-	4.222,50	147,84	2.497,01	59,14%	147,84	2.497,01	59,14%	102,16	1.725,49	40,85%
3.4	S	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE EASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	100,00				100,00	115,40	1,0000	-	-	11.540,00	-	0,00%	-	-	-	100,00	11.540,00	100,00%	
3.5	S	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	100,00				100,00	115,40	1,0000	-	-	11.540,00	-	0,00%	-	-	-	100,00	11.540,00	100,00%	
3.6	S	ORSE	3212	COLCHÃO DE AREIA	M²	200,00				200,00	89,17	1,0000	-	-	17.834,00	25,92	2.311,28	12,95%	40,40	4.404,99	24,70%	150,60	13.429,00	75,30%

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	SIN	VALOR LICITADO	R\$	1.008.274,48	REPLAN (%)
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	898.764,78	
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	898.764,78	0,00%
BM - PERÍODO	00101122 03102122	SALDO CONTRATUAL	R\$	758.942,03	84,25%
		BM - R\$ MENSAL	R\$	28.509,67	3,17%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	141.722,70	15,75%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE		
CONTRATADA	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	CNPJ :	21.127.171/0001-56
PROCESSO Nº	018/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021	BDI %	MAT = - SER = 18,81%

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO										SUPRIMIR	TOTAL
4.0	PAVIMENTAÇÃO																					
4.1	S	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	400,00			400,00	40,10	1,0000	-	-	828.817,00	22.232,08	2,69%		124.322,70	15,04%	400,00	16.040,00	100,00%
4.2	S	EMLURB	20.09.030	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	M	350,00		350,00	30,10	1,0000	-	-	10.535,00	70,40	2.118,04	20,11%	70,40	2.119,04	20,11%	279,60	8.415,96	79,89%
4.3	S	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	3.500,00		3.500,00	97,64	1,0000	-	-	341.740,00	147,84	14.435,09	4,22%	640,70	53.436,70	18,56%	2.850,30	278.303,28	81,44%
4.4	S	EMLURB	20.04.044	PINTURA ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO MANUAL, COM O FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5KG/M2 (CODIGO 20.04.105) SERVIÇO DIURNO.	M²	200,00		200,00	3,77	1,0000	-	-	754,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	754,00	100,00%
4.5	S	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M²	200,00		200,00	7,22	1,0000	-	-	1.444,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	1.444,00	100,00%
4.6	S	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M²	200,00		200,00	872,81	1,0000	-	-	174.562,00	-	-	0,00%	2,81	2.452,59	1,41%	197,19	172.109,40	98,50%
4.7	S	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M²	200,00		200,00	939,33	1,0000	-	-	197.866,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	197.866,00	100,00%
4.8	S	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM), AF_07/2020	M³xKM	14.000,00		14.000,00	2,13	1,0000	-	-	29.820,00	222,78	474,52	1,59%	222,78	474,52	1,59%	13.777,22	29.345,47	98,41%
4.9	S	EMLURB	20.07.080	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS - (TAPA BURACO) ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 (ÁREA TOTAL POR RUA INFERIOR OU IGUAL A 30 M²).	M²	800,00		800,00	66,85	1,0000	-	-	53.480,00	43,46	2.905,30	5,43%	800,00	53.480,00	100,00%	0,00	-	0,00%

HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:34995676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	S/N	VALOR LICITADO	R\$	1.000.274,48	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	898.764,78		
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	898.764,78	0,00%	
BM - PERÍODO	88/01/22	93/02/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	758.042,03	84,25%
MEDÇÃO Nº: 6		BM-6	BM - R\$ MENSAL	R\$	28.500,67	3,17%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	141.722,70	15,75%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE		
CONTRATADA	ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	CNPJ :	21.127.171/0001-56
PROCESSO Nº	016/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021	BDI =	MAT = -- SER = 19,81%

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					QUANTIDADES				FINANCEIRO						QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL											
4.10	S	EMLURB	20.09.070	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREIA 1 2, E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MIST. DE CIM. E AREIA 1 6 C/ 6 CM DE ESPESURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREIA 1 2 INCLUSIVE BASE DE CONC.1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESURA.	M	200,00				200,00	40,07	1,0000	-	-	8.014,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	8.014,00	100,00%
4.11	S	EMLURB	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESURA.	M	100,00				100,00	25,62	1,0000	-	-	2.562,00	89,70	2.299,11	89,70%	92,50	2.369,85	92,50%	7,50	192,15	7,50%
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>															<b>898.764,78</b>		<b>28.500,67</b>	<b>3,17%</b>		<b>141.722,70</b>	<b>15,75%</b>		<b>758.042,03</b>	<b>84,25%</b>
EMPRESA					ENGENHEIRO FISCAL					TÉCNICO FISCAL					SECRETÁRIO DE OBRAS									
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					ATESTO					ATESTO					ATESTO									

**MAURICIO ZAPONI RACHID** Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID

**BM-6**

DATA : sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

VALOR: R\$ 28.500,67

VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS, E SESSENTA E SETE CENTAVOS

**HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449** Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



**OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - "06" - MEMÓRIA**

**DATA INI = 06/01/22**

**DATA FIM = 03/02/22**

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					QTDE	C/P	L	H/E	A	V	DMT	TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²								
<b>2.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS</b>												
2.1	EMLURB	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M²								
2.2	EMLURB	03.01.220	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	M²								
2.3	EMLURB	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M²								111,99
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 5			9,30	2,70					25,11
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 6			21,00	1,20					25,20
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 7			8,50	1,20					10,20
			RUA LUIS BRAGA - TRECHO 8			3,00	1,20					3,60
			RUA ODILON MELO - TRECHO 1			20,00	3,60					72,00
			RUA ODILON MELO - TRECHO 2			27,90	3,70					103,23
			<b>AJUSTE DE QUANTITATIVO</b>							-127,95		-127,95
<b>3.0 TERRAPLENAGEM / SUB BASE / BASE</b>												
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³								
3.2	EMLURB	05.01.140	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO.	M³								
3.3	EMLURB	20.02.030	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESURA DE 20,0 CM, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNEC.DO MATERIAL PROV.DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO),D.M.T.12KM.	M³								147,84
			AV. SIRINHAÉM			35,20	4,20					147,84
3.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.5	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.6	ORSE	3212	COLCHÃO DE AREIA	M³				0,10	259,23			25,92
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO</b>												
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M								
4.2	EMLURB	20.09.030	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESURA.	M	2,00	35,20						70,40
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²		35,20	4,20					147,84
4.4	EMLURB	20.04.044	PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MANUAL COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5KG/M2 (CODIGO 20.04.105) SERVICO DIURNO.	M²								
4.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²								
4.6	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								

**MAURICIO ZAPONI RACHID**  
Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID

**HENRIQUE MOREIRA**  
Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:34995676449  
76449

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



**OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - "06" - MEMORIA**

DATA INI = 06/01/22

DATA FIM = 03/02/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS								
					QTDE	C/P	L	H/E	A	V	DMT	TOTAL	
4.7	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³									
4.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF_07/2020	M³xKM				0,20	111,39			10,00	222,78
4.9	EMLURB	20.07.080	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDIOS GRANITICOS - ( TAPA BURACO ) ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 ( AREA TOTAL POR RUA INFERIOR OU IGUAL A 30 M2 ).	M²									43,46
			ÁREA DEMOLIDADA						111,39				111,39
			AJUSTE DE QUANTITATIVO						-67,93				-67,93
4.10	EMLURB	20.09.070	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO , REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREIA 1 2, E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MIST. DE CIM. E AREIA 1 6 C/ 6 CM DE ESPESSURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREIA 1 2 INCLUSIVE BASE DE CONC.1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA.	M									
4.11	EMLURB	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDIOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M		89,70							89,70

MAURICIO Assinado  
 de forma  
 digital por  
 ZAPONI MAURICIO  
 ZAPONI  
 RACHID RACHID


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021

**RUA LUÍS BRAGA - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO**

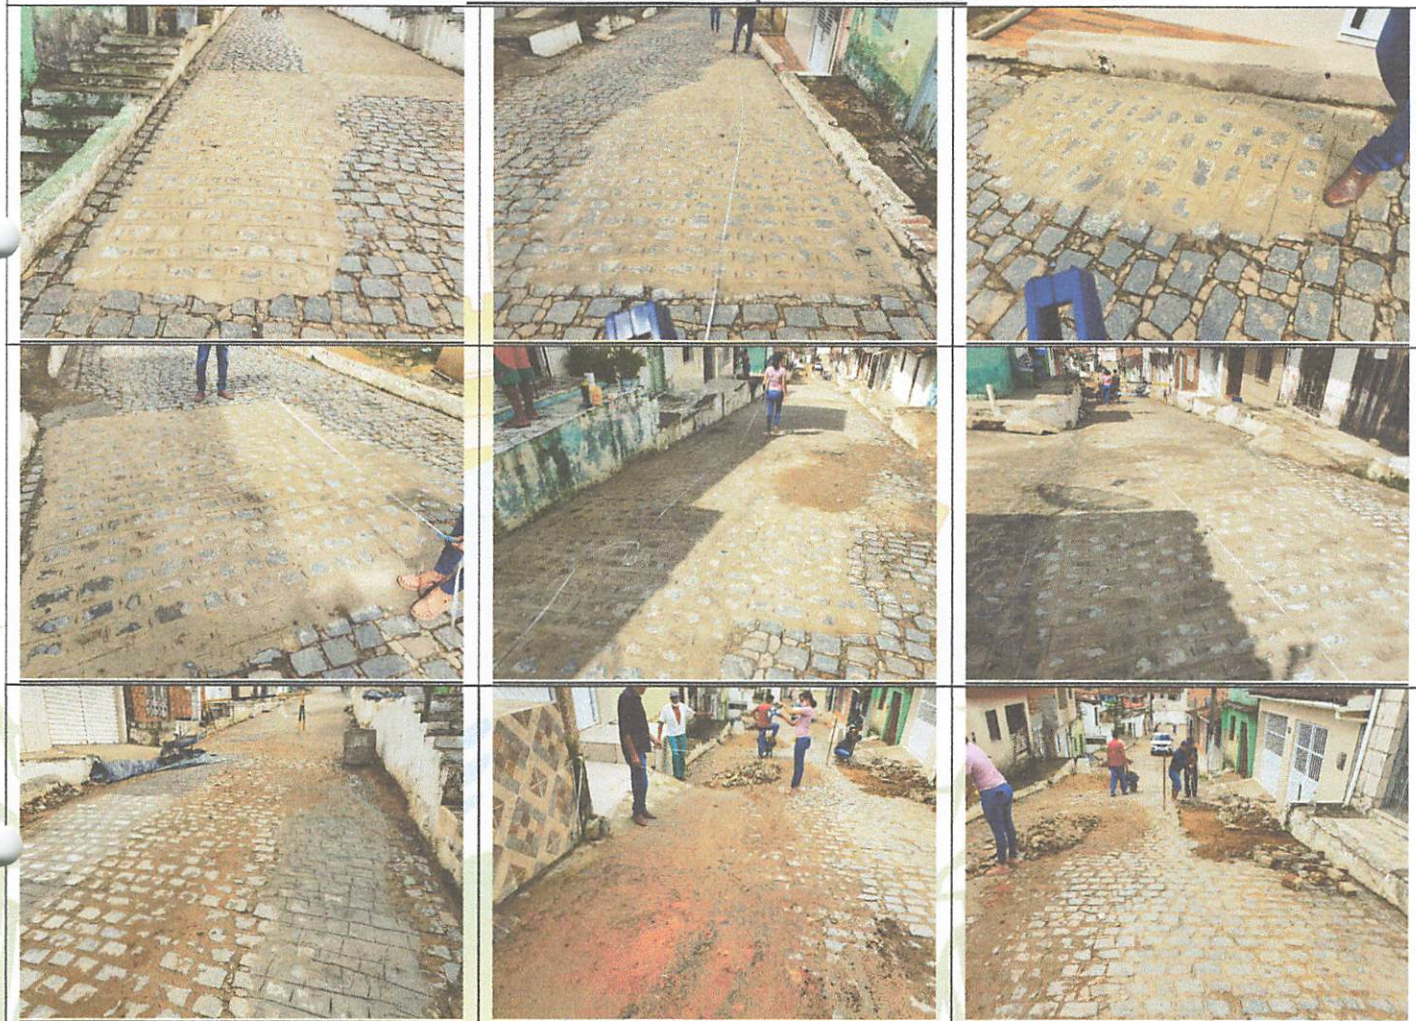

serviços executados na via:

- ✓ Demolição da pavimentação em paralelepípedos sobre areia danificada;
- ✓ Colocação de colchão de areia;
- ✓ Compactação
- ✓ Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

HENRIQUE  
MOREIRA  
GRIZZI:3499567  
6449

Assinado de forma  
digital por  
HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:34995676449

MAURICIO  
ZAPONI  
RACHID

Assinado de  
forma digital  
por MAURICIO  
ZAPONI RACHID

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021

**RUA ODILON MELO - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO**



**MAURICIO  
ZAPONI RACHID**

Assinado de forma  
digital por MAURICIO  
ZAPONI RACHID

**HENRIQUE  
MOREIRA  
GRIZZI:3499  
5676449**

Assinado de  
forma digital por  
HENRIQUE  
MOREIRA  
GRIZZI:34995676  
449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021



**HENRIQUE MOREIRA**  
Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:349 95676449  
GRIZZI:349956 76449

**MAURICIO O ZAPONI RACHID**  
Assinado de forma digital por MAURICIO ZAPONI RACHID



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 06

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021



Construção do pavimento novo

serviços executados o longo dos trechos foram:

- ✓ Demolição da pavimentação em paralelepípedos sobre areia danificada;
- ✓ Colocação de colchão de areia;
- ✓ Compactação
- ✓ Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

MAURICIO  
ZAPONI  
RACHID

Assinado de forma  
digital por  
MAURICIO ZAPONI  
RACHID
